

«УТВЕРЖУ»  
распоряжением Главного управ  
территориальной пол  
Московской об  
от 30.10.2020  
(в редакции распоря  
Главного управ  
территориальной пол  
Московской об  
от 16.08.2021 №

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: Городской округ Шатура

Наименование проекта: «Приобретение и установка окон ПВХ в МБДОУ «Детский сад №15»

**1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:**

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неисполненных работ, руб.
	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	
2 021280	1900000	101060	20220	1080785,62	1007001,7	53563,92	20220	1071278,40	9507,22
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	13=5-9
Ос									на

\* - Денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

**2. Сведения об итогах реализации проекта.**

1. Объект, включенный в проект, завершен \_\_\_\_\_ своевременно (своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: -

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 20.10.2022 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 28.11.2022 г.

5. К отчету прилагаются на 1 листе: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Живнов Эдуард Николаевич  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Глава Городского округа:

Арюхин Алексей Владимирович  
Админ (Ф.И.О.)  
М.П. Городского округа  
Шатура  
Московской

  
(подпись)

Дата «28» ноября 2022 г.




Фото ДО реализации проекта

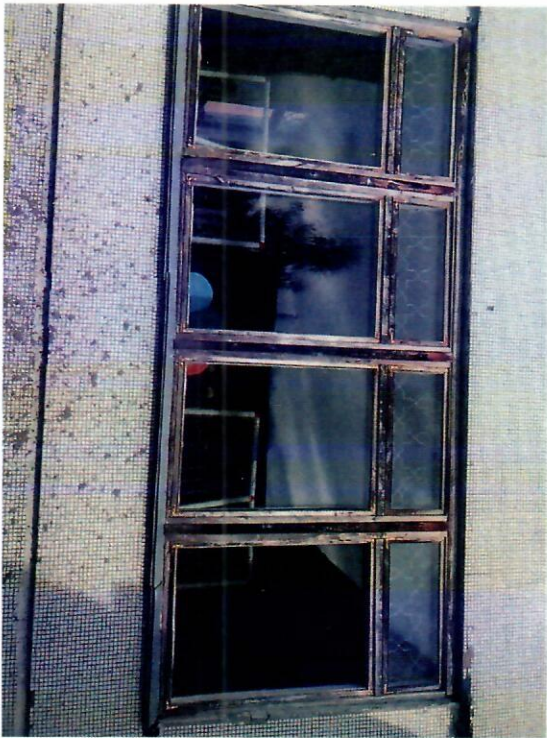


Фото ПОСЛЕ реализации проекта

