

«УТВЕРЖ
распоряжением Главного управ
территориальной по
Московской о
от 30.10.2021
(в редакции распоря
Главного управ
территориальной по
Московской о
от 16.08.2021 №

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: Городской округ Шатура

Наименование проекта: «Приобретение и установка окон ПВХ в спортзале МБОУ
«Петровская основная общеобразовательная школа»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неисполн ванных ых средств, руб.	Пр
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населен ия*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населен ия*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населен ия*	13=5-9	Ост вкл нас
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
372350	350000	18620	3730	297869,89	279284,34	14855,55	3730	297111	279284,34	14855,55	2971,11	758,89	Ост вкл нас

* - Денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности


2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен _____ раньше срока
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: -
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 03.10.2022 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 30.10.2022 г.

5. К отчету прилагаются на 1 листе: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Живцов Эдуард Николаевич
(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава Городского округа:

Артохин Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)


(подпись)



Дата «18» ноября 2022 г.

Фото ДО реализации проекта

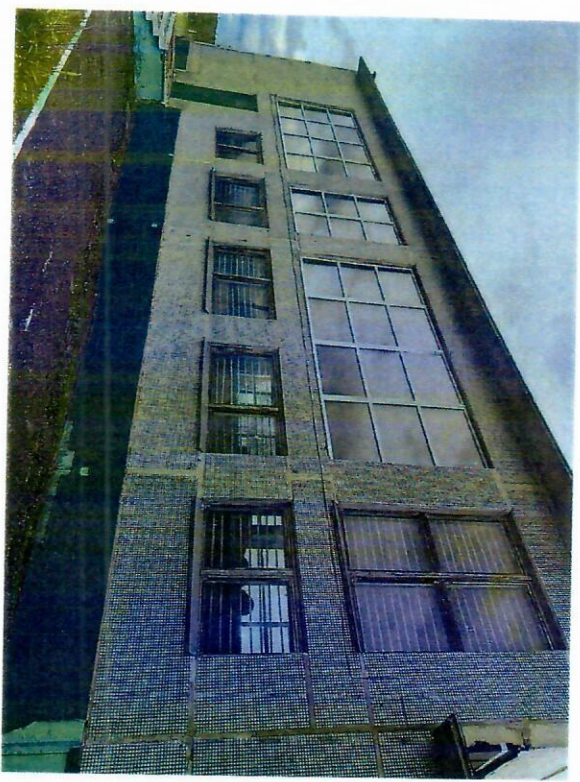


Фото ПОСЛЕ реализации проекта

