

«УТВЕРЖ,
распоряжением Главного управ
территориальной пол
Московской ое
от 30.10.2020
(в редакции распоря
Главного управ
территориальной пол
Московской ое
от 16.08.2021 №

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: Городской округ Щатурса

Наименование проекта: «Приобретение и установка забора территории МБОУ "ОИШ им. Героя Советского Союза Б.И. Верем

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Остаток неиспользованных средств, руб.			
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9
1595750	1 500 000	79790	15960	766361,44	712502,38	37899,06	15960	757981,25	712502,38	37899,06	7579,81	8380,19

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: -
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 26.10.2022 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 16.11.2022 г.

Фото ДО реализации проекта

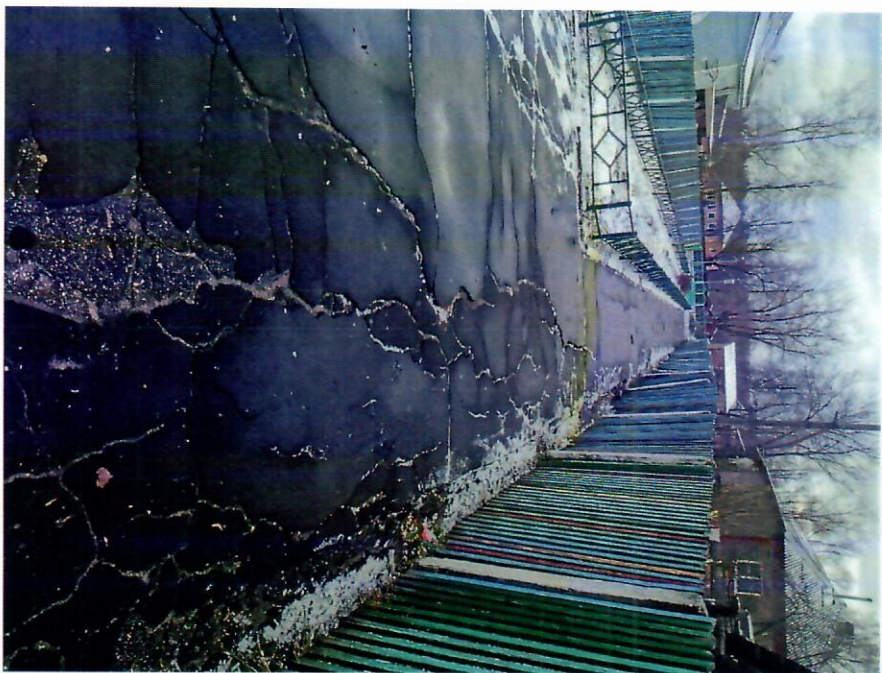


Фото ПОСЛЕ реализации проекта



5. К отчету прилагаются на 1 листе: (фотографичи объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, моржественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Барсуков Владимир Николаевич
(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава I ордского округа:

Артохин Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)


(подпись)

М.П.
Дата «28» ноября 2022 г.

